



いたばしNo.1 実現プラン

—「計画編」追録版—

(平成 22 年度)

平成 22 年 1 月

板 橋 区

目 次

1 追録版の目的	1
2 P D C A サイクルに基づき平成 22 年度から追加・修正する計画事業	2
3 緊急財政対策の実施による影響	3
4 財政状況及び計画事業数・計画事業経費	5
5 事業計画一覧	8
事業計画一覧の見方・注意事項	8
あたたかい人づくりナンバーワン	9
人づくり力 UP	9
子育て力 UP	10
医療・福祉力 UP	11
元気なまちづくりナンバーワン	12
自治力 UP	12
シニア世代力 UP	12
産業活力 UP	13
安心・安全ナンバーワン	14
安心・安全力 UP	14
緑と環境力 UP	16
都市再生力 UP	18
3 つのナンバーワンに共通して	24
区民くらし充実力 UP	24

1 追録版の目的


平成 20 年 1 月、板橋区は「板橋区基本計画（平成 18～27 年度）」（以下「基本計画」といいます。）の施策体系との整合性を確保しつつ、区長マニフェストに掲げる「3つのナンバーワン」と「10のいたばし力UP」の実現に向けた施策を計画的に進めていくため、「いたばし 1 実現プラン（平成 20～22 年度）」（以下「1プラン」といいます。）を策定しました。このうち、「計画編」では、基本計画に基づく実施計画事業を「3つのナンバーワン」と「10のいたばし力UP」に分類し、各計画事業の3か年の事業量・事業経費・スケジュールなどを示しています。

「計画編」の取り組み内容については、執行計画の進行管理を行い事業の実施状況を把握する“進捗評価”、事業の有効性・必要性を総合的に評定した結果を次年度以降に反映させる“事務事業評価”、さらに事務事業の上位の施策を対象とする“施策評価”という、3つの評価を組み合わせる総合的に評価する「1プラン評価」を実施しています。このように1プランの期間中においても、計画の策定（Plan）から事業を実施（Do）し、その実績・成果に対する評価（Check）を適切に行い、次の計画の策定や追加・修正に向けて見直し（Action）をしていく、いわゆるPDCAサイクルを絶えず機能させるようにしています。

平成 22 年度は、3か年の1プランを締め括る集大成の年度であるとともに、基本計画の前期5か年が経過して折り返し点を迎えることにより、後期5か年へとつなげていく重要な節目の年度となります。その一方では、一昨年後半から引き続く厳しい経済情勢に連動し、区の歳入についても激しい減少が予測されることから、昨年 11 月以降、区は歳出抑制を中心とする緊急財政対策に取り組んできたところです。

この新しい追録版は、PDCAサイクルに基づく追加・修正はもとより、緊急財政対策を講じた結果が、1プランの内容に如何に反映されているのかを明らかにするために作成しました。

【 1プランのPDCA サイクル図】

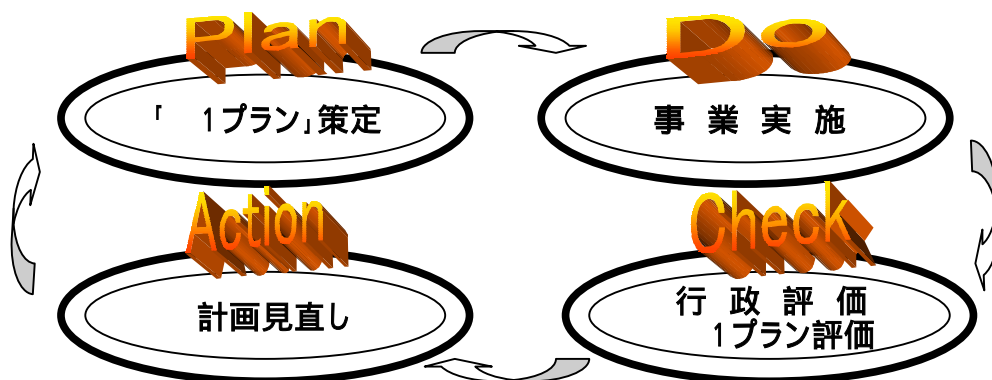

PDCA サイクル

PDCA サイクルとは、計画（PLAN） 実施（DO） 評価（CHECK） 改善（ACTION）を次の計画に反映させ、再び計画（PLAN） 実施（DO） 評価（CHECK） 改善（ACTION）という手順を繰り返すことにより、区民ニーズや社会・経済情勢などを踏まえて施策・事務事業を見直し、効率的・効果的に区政経営を行っていくための考え方です。

2 PDCA サイクルに基づき平成 22 年度から追加・修正する計画事業

下表の事業を含む全ての計画事業の事業量・経費等は、9 頁から 24 頁の「事業計画一覧」のとおりです。

(1) 新規事業（1 事業）

事業番号	事業名 [担当課]	3 つのナンバーワン	10 のいたばし力 UP	事業内容
[078]	電子区役所の推進 (3) 住基法改正による システムの一部再構築 [I T 推進課、戸籍住民課]	3 つのナンバーワン に共通して	区民くらし 充实力 UP	平成 24 年 7 月施行予定の住民基本台帳法の一部改正 (外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える) に向けてシステムの再構築を進める

(2) 計画を前倒し・拡充した事業（2 事業）

事業番号	事業名 [担当課]	3 つのナンバーワン	10 のいたばし力 UP	事業変更内容
[057]	新エネルギー・省エネルギーの普及・啓発 [環境保全課]	安心・安全	緑と環境力 UP	新エネ・省エネ機器の設置助成経費を平成 21 年度に引き続き増額するとともに、ニーズに合わせて機器ごとの助成台数の見直しを行う
[075]	区道の新設 (3) 補助 2 4 9 号線 [都市計画課]	安心・安全	都市再生力 UP	環状 8 号線から放射第 35 号線（新大宮バイパス）までの区間のうち未整備の約 100m について、調査・設計や地元協議等を進める

(3) 計画を延伸した事業（1 事業）

事業番号	事業名 [担当課]	3 つのナンバーワン	10 のいたばし力 UP	事業変更内容
[071]	市街地再開発事業の推進 (1) 上板橋駅南口駅前 地区 [再開発課]	安心・安全	都市再生力 UP	事業組合を設立するために必要となる地権者等の同意率が上がらず、都市計画決定から 5 年以上が経過しているため、事業計画の再検討を進める

3 緊急財政対策の実施による影響

平成 20 年 9 月に発生したリーマンショック以来、長引く景気後退の影響による企業収益の悪化に伴い、法人住民税などの都税収入が前年度に比べて 1 兆円以上も減少するという見通しが、平成 21 年 11 月 5 日に東京都から示されました。

板橋区など特別区には、法人住民税等を財源とする特別区交付金が東京都から交付されていますが、本区に交付される特別区交付金の額は区の歳入の中でも最も大きな割合を占めています。平成 21 年 11 月時点における東京都の見通しによりますと、想定をはるかに上回る法人住民税などの減収に伴い、本区に交付される特別区交付金が平成 21 年度と 22 年度の 2 か年で 150 億円を超える減少が見込まれるなど、区はいまだかつて経験したことのない、約 196 億円という巨額の財源不足に直面することが予測されました。

このような区財政の非常事態に対応するため、区ではいち早く、緊急財政対策会議の設置を皮切りに、歳出の抑制と歳入の確保に向けて、平成 21 年度と 22 年度の 2 か年にわたる区役所全庁を挙げた取り組みを開始し、22 年度予算の編成にあたっては、実施計画事業についても聖域とすることなく見直し、事業内容と経費を精査することにより徹底的な歳出の抑制を図りました。

その結果、平成 22 年度実施計画事業のうち 23 事業 26 項目にわたって、計画事業量の全部又は一部の 23 年度以降への繰延べや、事業経費の圧縮・削減などが行われています。

緊急財政対策事業一覧

- A：事業を休廃止または、23年度以降に繰り延べたもの
 B：事業規模を縮小または、一部23年度以降に繰り延べたもの
 C：事業規模の拡充を23年度以降に繰り延べたもの

事業番号	事業名	区分	対策内容
003	放課後の居場所づくり (3)あいキッズ事業	B	23年度新規校実施のための準備工事経費を縮減した。
008	地域体育施設の改修 (2)温水プール	B	高島平温水プールは既に設計段階に入っており、また、中断した場合には設備機器を共用する隣接の高島平ふれあい館の運営が困難となるため、繰り延べによる影響を考慮し計画どおり実施する。小豆沢体育館温水プールは実施設計前の段階であったため、新規着手施設整備事業は原則実施を見合わせることにし、23年度に繰り延べた。
082	(仮称)シニア活動センターの開設	A	新規着手施設整備事業は原則実施を見合わせることにし、設計を23年度に繰り延べた。
029	新産業育成ゾーンの整備	B	(仮称)新産業育成ラザに要する、備品(計測検査機器)購入の一部を23年度に繰り延べた。
030	観光メニューの開発・整備と観光意識の醸成	B	既存公開企業での見学及び区民ツアーの実施が可能なため、観光資源整備補助を22年度については休止した。
032	区営住宅の高齢者向け住戸改善	B	既に22年度空室となることが確定している1戸については実施することとし、未確定な1戸については繰り延べた。
033	高齢者住宅の安否確認機能強化	B	22年度更新予定の2棟のうち、設置年度の新しい桜川けやき苑の分を動作状況及び点検結果を考慮して23年度に繰り延べた。

事業番号	事業名	区分	対策内容
034	二次避難所の充実	A	施設側の事情により二次避難所に配備する物資の備蓄場所の確保が困難なことから、22年度は、整備する方策も含めて検討していくこととし、実施を繰り延べた。
035	防災無線デジタル化とセンター機能の充実	B	本庁舎南館の改築が22年度は耐震補強を含めた多角的な検討を行うことになったことから、防災センター設計、防災情報システム設計の繰り延べ及び気象観測システム稼動後に接続できる職員参集安否確認システムの構築を繰り延べた。
038	公園・公衆トイレの改修	A	使用しにくい危険性はないため、22年度予定分の改修を繰り延べた。
039	公園大型遊具の改修	A	22年度は安全確保のため修繕を行う予定であったが、国からの交付金を活用し、21年度補正予算により対応する。
040	細街路の拡幅・指導	B	これまでの実績に基づいた事業量の精査を行い、事業規模を縮小した。
041	区道の補修	B	緊急度によって実施路線を精査することにより、事業規模を縮小した。
042	橋りょうの架替・改良 (2)調査・塗装	B	長寿命化のため、計画的な塗装を行う必要があるが、緊急度によって区施工による実施橋を7橋から4橋に精査し縮小した。
047	小中学校「緑のカーテン」 体験学習の充実	B	21年度に準備工事の完了した24校について事業を実施し、23年度実施準備校11校の工事を繰り延べた。
051	公園の改修	B	改修整備対象公園・緑地を精査し、着手済み公園のみ事業継続し、その他の部分について繰り延べた。
052	公園台帳の整備	A	22年度分を21年度に前倒して実施したことから、3か年分の事業量を実施済みである。
061	学校の改築	B	中台中は、実施設計まで行うが、工事については仮設校舎の設置、校舎解体を25年度へと繰り延べ、22年度は補強工事を実施する。
062	学校施設の改修 (1)大規模改修	B	22年度に予定していた志村第二中の大規模改修工事を23年度に繰り延べた。なお、当初耐震補強工事を予定していた前野小と大規模改修工事の向原中については、一度改築へと変更したが、22年度に改めて耐震補強等について調査・検討するとともに、補強工事を実施する。
062	学校施設の改修 (2)校庭の改修	A	毎年1校ずつの計画ではあるが、実施を繰り延べた。
062	学校施設の改修 (3)散水設備の改修	A	毎年1校ずつの計画ではあるが、実施を繰り延べた。
062	学校施設の改修 (4)プールの改修	B	21年度設計を行った1校についてプールの改修工事を実施し、それ以外の改修設計を繰り延べた。
065	赤塚支所の改築	B	仮庁舎解体(旧図書館)は工事工程の関係から調整した結果、23年度へ繰り延べた。

事業番号	事業名	区分	対策内容
066	区民集会所の改修	B	老朽化の程度を考慮し、改修等を行う集会所を精査し、一部繰り延べた。(繰延:幸町集会所 一部繰延:南板橋集会所、板橋四丁目集会所、下板橋駅前集会所、赤塚高台集会所、清水町集会所、坂下二丁目集会所)
074	コミュニティバスの実験運行	C	21年度実施路線のフォローアップ調査と区民の要望が強い2路線目の導入可能性調査について、前倒しで実施する予定であったが繰り延べた。
076	区役所本庁舎南館の改築	B	21年度に実施する耐震診断の結果を踏まえ、本庁舎南館の改築について耐震補強を含めた多角的な検討を行うこととし、一部事業費を繰り延べた。

上記の事業以外にも予算査定で精査し、経費を縮減等している事業があります。

4 財政状況及び計画事業数・計画事業経費

(1) 財政状況(平成22年度分)

平成20年1月の計画策定時における財政見通しと平成22年度の予算フレームを比較した表です。

(単位:百万円)


一般会計	当初計画(20年1月) 【a】	修正後 【b】	増減額 【c=b-a】	増減率(%) 【c/a】
歳入	174,903	178,760	3,857	2.2
特別区税	44,987	40,690	4,297	9.6
特別区交付金	69,916	57,200	12,716	18.2
国・都支出金	35,544	42,934	7,390	20.8
特別区債	3,000	3,760	760	25.3
その他歳入	21,456	34,176	12,720	59.3
歳出	174,903	178,760	3,857	2.2
人件費	37,605	37,728	123	0.3
扶助費	49,818	58,135	8,317	16.7
公債費	6,950	7,200	250	3.6
計画事業費	17,399	16,598	801	4.6
		(内訳:計画事業費 16,580、人件費 18)		
非計画事業費	63,131	59,099	4,032	6.4

修正後の計画事業費は、予算分類上の計画事業費と人件費の一部を含めた金額です。
なお、修正後の人件費は、計画事業費の一部とした金額を差し引いています。

(2) 計画事業総数・計画事業経費

「1プラン」計画期間(3か年分)の推移

当初計画の策定から追録版の作成を経て、「1プラン」3か年分の計画事業総数・計画事業経費の推移してきた状況を示します。

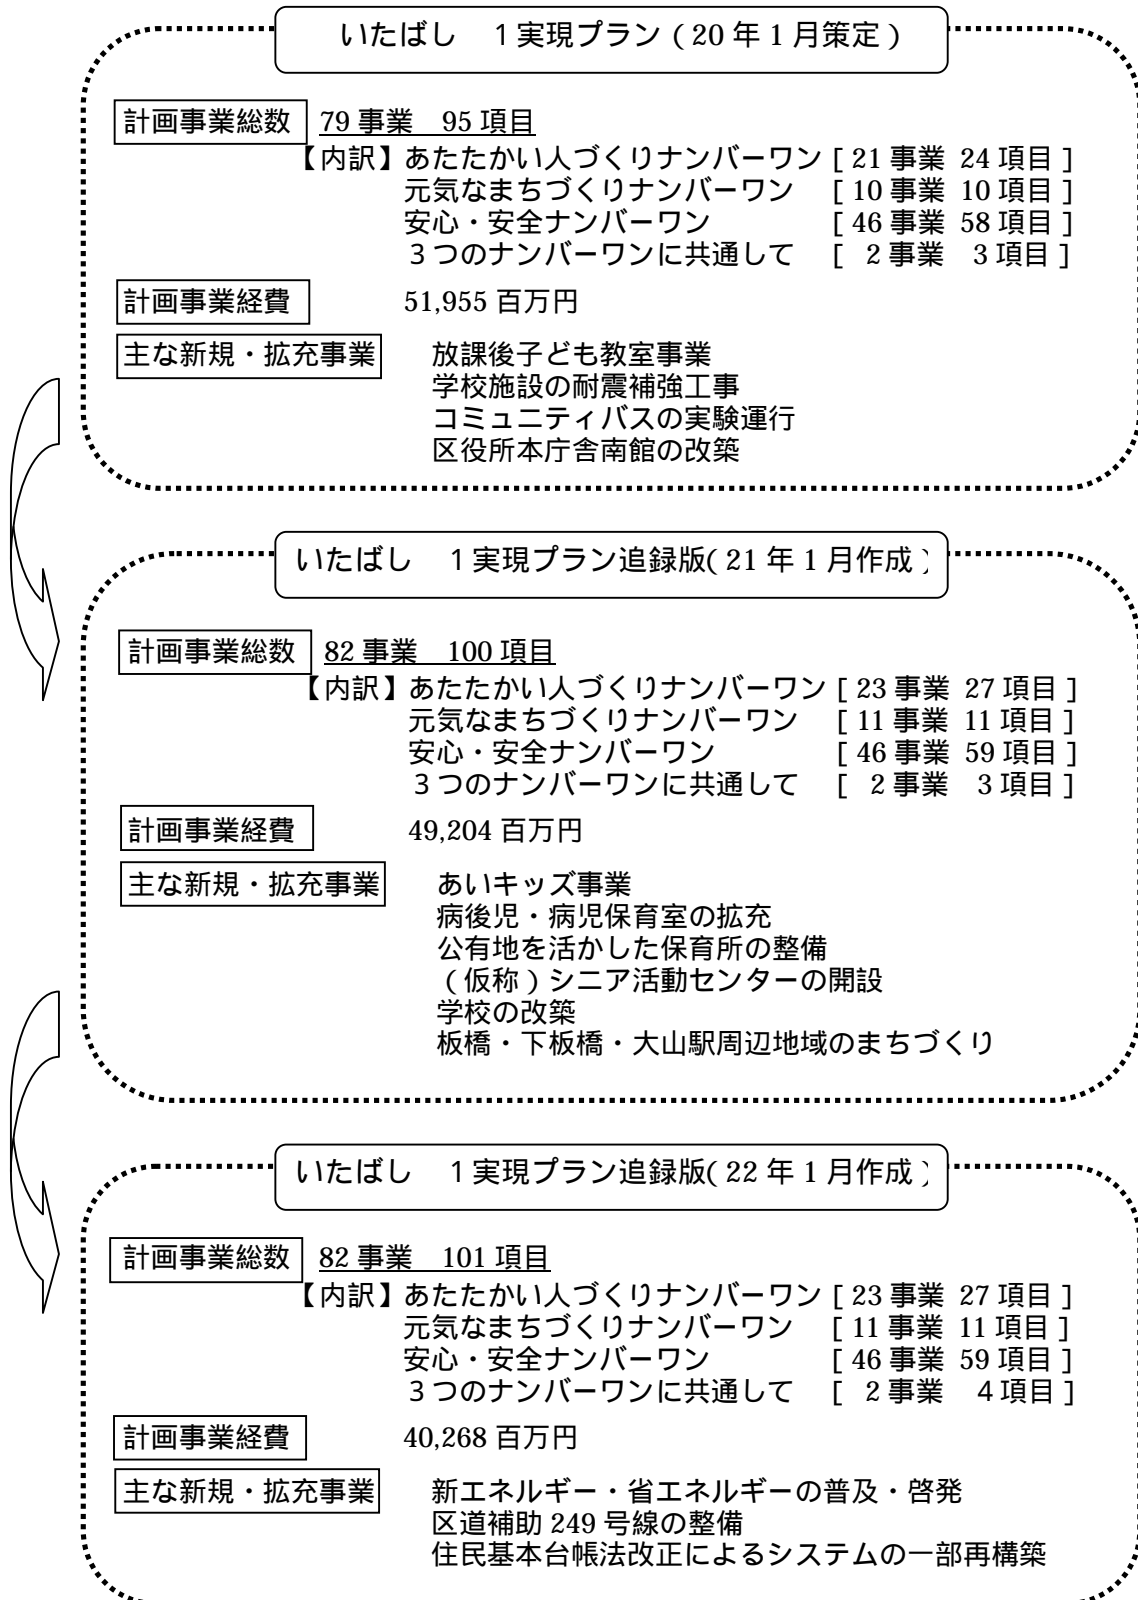

本計画における事業経費等詳細一覧

3つのナンバーワン	事業経費(単位:百万円)						
	10のいたばし力UP	20年度		21年度		22年度	
あたたかい人づくりナンバーワン	17事業 20項目	1,441 (1,591)	23事業 24項目	591 (807)	16事業 17項目	2,389 (2,589)	4,421 (4,987)
人づくり力UP	9事業 12項目	1,253 (1,246)	10事業 11項目	267 (715)	7事業 8項目	1,626 (1,104)	3,146 (3,065)
子育て力UP	4事業 4項目	17 (18)	6事業 6項目	72 (16)	4事業 4項目	238 (9)	327 (43)
医療・福祉力UP	4事業 4項目	171 (327)	7事業 7項目	252 (76)	5事業 5項目	525 (1,476)	948 (1,879)
元気なまちづくりナンバーワン	10事業 10項目	399 (660)	10事業 10項目	534 (12)	8事業 8項目	111 (5)	1,044 (677)
自治力UP	1事業 1項目	6 (6)	1事業 1項目	6 (6)	1事業 1項目	4 (4)	16 (16)
シニア世代力UP	3事業 3項目	383 (642)	4事業 4項目	263 (5)	2事業 2項目	60 (0)	706 (647)
産業活力UP	6事業 6項目	10 (12)	5事業 5項目	265 (1)	5事業 5項目	47 (1)	322 (14)
安心・安全ナンバーワン	46事業 57項目	10,863 (13,260)	42事業 52項目	9,719 (18,013)	37事業 45項目	13,520 (14,664)	34,102 (45,937)
安心・安全力UP	15事業 16項目	2,023 (2,324)	14事業 14項目	2,067 (2,131)	13事業 13項目	1,721 (2,325)	5,811 (6,780)
緑と環境力UP	14事業 14項目	401 (429)	13事業 13項目	290 (331)	10事業 10項目	1,125 (389)	1,816 (1,149)
都市再生力UP	17事業 27項目	8,439 (10,507)	15事業 25項目	7,362 (15,551)	14事業 22項目	10,674 (11,950)	26,475 (38,008)
3つのナンバーワンに共通して	2事業 2項目	88 (90)	2事業 2項目	35 (123)	2事業 3項目	578 (141)	701 (354)
区民くらし充実力UP	2事業 2項目	88 (90)	2事業 2項目	35 (123)	2事業 3項目	578 (141)	701 (354)
合計	75事業 89項目	12,791 (15,601)	77事業 88項目	10,879 (18,955)	63事業 73項目	16,598 (17,399)	40,268 (51,955)

- ・各事業費(千円単位)を集計し、百万円単位に簡略化した数値です。
- ・20・21年度の事業経費については、最終補正後の予算を反映しています。
- ・事業経費欄の()内の数値は、20年度策定当初の金額です。
- ・計画事業数については、当該年度に事業を実施又は実施予定の計画の数値です。
- ・22年度については、21年1月追録版の計画事業数88項目(77事業)のうち、8項目(8事業)が3か年の予定完了、8項目(7事業)が緊急財政対策等により減少する一方、新規1項目(1事業)を追加しています。

事業計画一覧

事業計画一覧の見方・注意事項

安心・安全ナンバーワン											
安心・安全力UP											
事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	事業方向性
032	区営住宅の高齢者 向け住戸改善 〔都市整備部 住宅政策課〕	改善 6戸	12	改善 2戸 順調	4	継続	改善 2戸	4	改善 2戸	4	継続
							改善 2戸 改善予定 2戸 前倒し	8	改善 1戸 ◁	* 2	

3か年目標量：〔上段〕21年1月追録版時点の計画内容

〔下段〕平成22年度から新規に計画化された事業の計画内容

行政評価：「平成21年度板橋区行政評価(事務事業評価)結果」の二次評価結果(平成20年度執行状況を評価した結果)

〔表示内容〕

「拡大」：事業内容・活動量を増加させる場合

「継続」：事業の内容や執行方法などについては不断の工夫を要するが、事業水準を維持し、引き続き実施する場合

「改善」：成果向上やコスト削減を図るため、事業内容や執行方法などについて具体的な改善が必要な場合

「縮小」：事業内容・活動量を減少させる場合

「統合」：類似事業へ編入する場合

21年度計画：〔上段〕21年1月追録版時点の修正計画内容

〔下段〕「平成21年度進行管理対象指定事業及び実施計画事業執行状況報告(上半期、平成21年9月30日現在)」の進捗状況(網かけ表示)

22年度計画：〔上段〕21年1月追録版時点の修正計画内容

〔下段〕今回、追加・修正を反映した計画内容(網かけ表示)

事業量増減：21年1月追録版時点の計画に対して、追加・修正を反映した事業量の増減を表示

〔表示内容〕

「↗」：拡大・増加 「⇔」：増減なし 「↘」：縮小

進捗評価：21年度は9月と3月の補正予算を加味した評価内容

〔表示内容〕

「前倒し」：翌年度以降の事業量の一部又は全部を前倒しで実施する、若しくは実施する予定の場合

「順調」：計画どおり進行している、又は進行する予定の場合

「達成」：3か年の計画事業量が完了した場合

「遅延等」：計画事業量が遅延したり翌年度以降に繰延べを行ったりしている、又はその予定の場合

「事業移行」：他の事業へ移行した場合

事業経費について

百万円未満を切り上げ、百万円単位で表示

(1) 20年度及び21年度は最終補正後の予算で表示

(2) 22年度の修正後経費欄に「*」表示がある場合は、「緊急財政対策」で事業内容の全部又は一部を翌年度以降に繰延べ、若しくは経費の圧縮・削減等を図った事業

あたたかい人づくりナンバーワン

人づくりカUP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	
				進捗評価		進捗評価		事業量増減			
001	食育推進ネットワ ークの構築 〔健康生きがい部 健康推進課〕	食育ボランティア 30人 講習開催 90施設 情報紙発行	6	食育ボランティア 10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2	改善	食育ボランティア 10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2	食育ボランティア 10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2	継続
							食育ボランティア 12人 講習開催 14施設 情報紙発行 1回		食育ボランティア 10人 講習開催 30施設 情報紙発行		
002	学校給食の充実 〔教育委員会事務局 学務課〕	ドライシステム対 応型備品の導入 5校	63	導入 2校	29	継続	導入 2校	22	導入 1校	12	061「学校の改 築」062「学校施 設の改修(2)大規模 改修」にあわせて 実施する
							導入準備中 2校				
003	放課後の居場所づく り (1)放課後子ども教 室事業 〔教育委員会事務局 学校地域連携担当〕	(小学校新規実施 校) 居場所づくり 53校 学習支援 5校 地域交流 検討	124	(小学校新規実施 校) 居場所づくり 53校 学習支援 5校 地域交流 検討	124	統合	[003]放課後の居 場所づくり(3)あ いキッズ事業へ移 行				
		事業移行									
	(2)いきいき寺子屋 事業 〔教育委員会事務局 学校地域連携担当〕	新規 11校	3	新規 5校 (小学校)4校 (中学校)1校	1	改善	新規 3校 (小学校)	1	新規 3校 (小学校)	1	継続
							新規 4校 (小学校)		新規 3校 (小学校)		
	(3)あいキッズ事業 〔教育委員会事務局 学校地域連携担当〕	新規 12校 (小学校)	464				新規 4校 (小学校)	177	新規 8校 (小学校)	287	継続
		新規 4校 (小学校)					160		新規 8校 (小学校)		
004	児童館遊戯室の冷 房化 〔子ども家庭部 子ども政策課〕	冷房化 4室	30	冷房化 4室	30	達成					
005	児童館の新設 〔子ども家庭部 子ども政策課〕	新設 1館 (赤塚地区)	14	設計	-	縮小	工事	-	工事完了	14	
							工事中	-	工事完了	17	
		設計・工事経費は		065「赤塚支所の改築」に含む。初度調弁分を計上							
006	特別支援教育の環 境整備 (1)巡回指導等のた めの特別支援教室 の整備 〔教育委員会事務局 学務課〕	整備 6校	-	整備 3校	-	継続	整備 2校	-	整備 1校	-	062「学校施設の 改修(2)大規模改 修」にあわせて実 施する
						整備中 2校	-		-		
		経費は		062「学校施設の改修(1)大規模改修」に含む							
	(2)心身障がい学 級・通級指導学級 の整備充実 〔教育委員会事務局 学務課〕	小学校 1校 中学校 1校	40	中学校 1校	20	改善	小学校 1校	20			
							小学校 1校 (改修工完了)	20			
							達成				

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	事業方向性
007	図書館の改築 〔教育委員会事務局 中央図書館〕	(赤塚図書館) 改築 (清水図書館) 改築・移転	201	(赤塚図書館) 仮移転 (清水図書館) 工事 順 調	6	継続	(赤塚図書館) 工事 (清水図書館) 工事完了・移転 (赤塚図書館) 工事中 (清水図書館) 工事中 (21年11月完了予定) 順 調	31	164	142	中央図書館につ いては改築方法等検 討し、事業を推進 する
赤塚図書館の工事等経費は 065「赤塚支所の改築」、清水図書館の工事等経費は 064「地域センター の整備 清水地域センターの改築」に含む。システム関係費・初度調弁等経費を計上											
008	地域体育施設の改 修 (1) 体育館 〔 区民文化部 スポーツ振興課 〕	(小豆沢体育館) 改修	1,039	工事完了 達 成	1,039						
008	(2) 温水プール 〔 区民文化部 スポーツ振興課 〕	(高島平温水プー ル)改修 (小豆沢体育館温 水プール)設計	1,126	(高島平温水プー ル)基本設計 遅延等	14	改善	(高島平温水プー ル)実施設計・工事 (高島平温水プー ル)実施設計中 遅延等	32 34	1,080	*1,130	小豆沢体育館温 水プールの22年度実 施設計については 23年度に、以降の スケジュールを1年 ずつ繰延べる
009	地域スポーツクラブ の育成・支援 〔 区民文化部 スポーツ振興課 〕	育成・支援 1団体 新規団体の募集・ 選考	2	1団体継続助成 順 調	1	継続	1団体継続助成 1団体継続助成 順 調	1 1	0	0	委託結果の調査・ 検討を行い、新規 団体の募集、選考 をめざす
080	区立学校の適正規 模・適正配置の推進 〔 教育委員会事務局 新しい学校づくり担当 〕	検討・審議	4				検討・審議 検討・審議 順 調	1 1	3	3	審議会の答申を受 けて適正規模・適 正配置計画を策定 し推進する

子育て力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	事業方向性
010	子育て支援者の養 成 〔 子ども家庭部 子ども家庭支援 センター 〕	1級 90人養成 2級 240人養成 3級 480人養成	16	1級 19人養成 2級 68人養成 3級 108人養成 遅延等	5	改善	1級 30人養成 2級 80人養成 3級 160人養成 2級 21人養成 3級 57人養成 順 調	6 6	5	5	継 続
011	学童クラブの拡充 〔 子ども家庭部 子ども政策課 〕	拡張 4か所	15	拡張 1か所 順 調	4	縮小	拡張 2か所 拡張完了 1か所 設計中 1か所 順 調	7 7	4	0	003「放課後の居 場所づくり(3)あい キッズ事業」の進 捗状況にあわせて 対応する
012	家庭福祉員事業の 充実 〔 子ども家庭部 保育サービス課 〕	家庭福祉員 増員 12人	19	増員 3人 遅延等	10	改善	増員 5人 増員 9人 達 成	9 9			

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
013	病後児・病児保育室の拡充 〔子ども家庭部 保育サービス課〕	病児保育室 2か 所開設	119	病後児・病児保育 室 調査・検討	0	継続	病児保育室 2か 所開設	119	病後児・病児保育 室 調査・検討	0	継続
				順調			病後児・病児保育 室 1か所開設 開設準備中 1か 所	51	病後児・病児保育 室 調査・検討	0	
							順調		➡		
081	公有地を活かした保 育所の整備 〔子ども家庭部 保育サービス課〕	整備 3園	255				開設準備 3園	0	開設 3園	255	23年度以降も残る 1園の開設をめざす
							事業者決定 2園 地元調整中 1園	0	開設 2園 協議・調整 1園	234	
							遅延等		↳		
014	すくすくサロン(乳幼 児専用ルーム)の整 備 〔子ども家庭部 子ども政策課〕	整備 1か所 (赤塚地区)	-						整備 1か所 (赤塚地区)	-	
									整備 1か所 (赤塚地区)	-	
				経費は 005「児童館の新設」に含む					➡		

医療・福祉力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
015	健康づくり協力店制 度の推進 〔健康生きがい部 健康推進課〕	協力店 90店 禁煙・分煙 90事業所	6	協力店 30店 禁煙・分煙 34事業所	2	継続	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2	継続
				順調			協力店 17店 禁煙・分煙 13事業所	2	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2	
							順調		➡		
016	こころの健康サポ ーターの養成 〔健康生きがい部 予防対策課〕	養成 45人	3	養成 22人	1	継続	養成 15人	1	養成 15人	1	継続
				順調			講座開催準備	1	自主活動団体支 援	0	
							順調		↳		
017	保健所・健康福祉セ ンターの改築 〔健康生きがい部 健康推進課〕	(高島平健康福祉 センター)工事	0				調査・検討	0	設計	-	082「(仮称)シニア活動センターの 開設」にあわせて 実施する
							調査・検討	0	調査・検討	-	
				設計経費は 082「(仮称)シニア活動センターの開設」に含む			遅延等		↳		
018	特別養護老人ホー ムの整備促進 〔健康生きがい部 介護保険課〕	助成 3か所	315	助成 1か所	128	継続	助成 1か所	89	助成 1か所	98	継続
				遅延等			助成予定 1か所	89		0	
							順調		↳		

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
019	地域密着型サービスの整備促進 〔健康生きがい部 介護保険課〕	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 3か所 認知症対応型デイ サービスセンター 3か所 認知症高齢者グ ループホーム 7か所	492	認知症高齢者グ ループホーム2か 所助成	42	改善	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 1か所 認知症対応型デイ サービスセンター 1か所 認知症高齢者グ ループホーム 3か所	255	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 1か所 認知症対応型デイ サービスセンター 1か所 認知症高齢者グ ループホーム 2か所	195	介護保険事業計画 に基づき、整備促 進を図る
							認知症高齢者グ ループホーム 2か所助成予定	128	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 1か所 認知症対応型デイ サービスセンター 1か所 認知症高齢者グ ループホーム 3か所	267	
				遅延等			遅延等				
020	精神障がい者グル ープホームの整備促進 〔福祉部 障がい者福祉課〕	助成 2か所	15				助成 2か所	15			継 続
							助成 1か所 遅延等	8			
021	生活介護施設・重症 心身障がい児(者)通 所施設の整備 〔福祉部 障がい者福祉課〕	(生活介護施設) 施設整備 1か所 定員 40人 (重症心身障がい 児(者)通所施設) 施設整備 1か所 定員 5人	502				設計	27	施設整備 1か所	475	23年6月開設予定
							設計中 遅延等	27	施設整備工事 1 か所	257	

020「精神障がい者グループホームの整備促進」、021「生活介護施設・重症心身障がい児(者)通所施設の整備」の担当部課欄は、平成22年4月1日の組織名称で表示

元気なまちづくりナンバーワン

自治力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
022	地区計画の推進 〔産業経済部 産業活性化推進室 都市整備部 都市計画課〕	計画策定 2地区 協議	16	調査・協議	6	継続	調査・協議	6	計画策定 2地区 (新河岸地区・他 1地区) 協議	4	継 続
							調査・協議中	6	計画策定 2地区 (新河岸地区・他 1地区) 協議	4	
				順 調			順 調				

シニア世代力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
023	グリーンカレッジの整 備 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	整備 1か所	-	整備工事	-	休 廃 止	整備完了	-			/
							整備完了	-			
				遅延等			達 成				
		経費は 024「ふれあい館の改築・改修(志村ふれあい館)」を含む									

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
024	ふれあい館の改築・ 改修 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	(志村ふれあい 館 改築 (高島平ふれあい 館)改修	641	志村ふれあい 館 工事	383	改善	志村ふれあい 館 工事完了 高島平ふれあい 館 実施設計・工 事	258	工事完了	60	
			高島平ふれあい 館 基本設計	高島平ふれあい 館 工事完了 高島平ふれあい 館 基本・実施設 計中			258	工事完了			
高島平ふれあい館の設計・工事経費は 008「地域体育施設の改修(2)高島平温水プール」に含む。初度調弁分を計上											
025	いこいの家の改築 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	(清水いこいの家) 改築	5	解体・工事	-	休 廃 止	工事完了	5			
				順 調			工事中 (21年11月完了予定)	5			
工事等経費は 064「地域センターの整備 清水地域センターの改築」に含む。初度調弁分を計上											
082	(仮称)シニア活動セ ンターの開設 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	設計	66				検討	0	設計	66	22年度設計につ いては23年度に、以 降のスケジュール を1年ずつ繰延べる
							検討	0	調査・検討	*0	
順 調											

産業活力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
026	地域連携型モデル 商店街の育成 〔産業経済部 産業振興課〕	育成 2商店街	4	協議会・計画策定 支援 2商店街	0	継 続	事業化調整 1商店街 街並み景観調査 1商店街	2	新規 1商店街基 礎調査	2	継 続
				遅延等			事業化調整 1商店街 街並み景観調査 1商店街	2	新規 1商店街事 業化 街並み景観調査 1商店街	8	
027	ショッピングロードの 整備 〔産業経済部 産業振興課 土木部 計画課〕	整備調整 2地区 道路補修 1地区	30	整備調整 3地区	0	継 続	整備調整 3地区 道路補修 1地区 (前期)	15	整備調整 2地区 道路補修 1地区 (後期)	15	継 続
				順 調			整備調整中 2地 区 道路補修 1地区 (前期)設計中	15	整備調整 2地区 道路補修 1地区 (後期)	15	
028	新創業支援施設の 整備 〔産業経済部 産業活性化推進室〕	検討	0	検討	0	休 廃 止	検討	0	検討	0	22年度の検討結果 により、23年度以 降の事業継続につ いて判断する
				遅延等			検討	0	検討	0	
順 調											
029	新産業育成ゾーンの 調査 〔産業経済部 産業活性化推進室〕	基本構想策定 新産業育成プラザ 開設準備	342	基本構想策定	7	継 続	技術支援機能・入 居企業調査 埋蔵文化財調査 用地買戻し	228	技術支援機能準 備等	107	22年度の圧縮した 経費については、 23年度に上乗せ し、事業を推進する
				順 調			技術支援機能・入 居企業調査 埋蔵文化財調査 用地買戻し	245	技術支援機能準 備・入居企業調査 等	*25	
順 調											

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)		
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費			
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	事業方向性		
030	観光メニューの開発・ 整備と観光意識の醸 成 〔産業経済部 くらしと観光課〕	ボランティア講座 観光コース整備 産業観光資源整 備	11	ボランティア講座 観光コース整備			3	継続	ボランティア講座 産業観光資源調 査・整備	4	ボランティア講座 産業観光資源整 備	4	22年度に予定して いた産業観光資源 整備は23年度に繰 延べる
				順 調				ボランティア講座 産業観光資源調 査・整備	4	ボランティア講座	* 1		
031	観光情報の発信・観 光センターの活用 〔産業経済部 くらしと観光課〕	展示 ガイドブック作成	2	展示 ガイドブック作成			2						
				達 成									

安心・安全ナンバーワン

安心・安全力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)		
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費			
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	事業方向性		
032	区営住宅の高齢者 向け住戸改善 〔都市整備部 住宅政策課〕	改善 6戸	12	改善 2戸			4	継続	改善 2戸	4	改善 2戸	4	継 続
				順 調				改善 2戸 改善予定 2戸 前倒し	8	改善 1戸	* 2		
033	高齢者住宅の安否 確認機能強化 〔都市整備部 住宅政策課〕	更新 7棟	132	更新 3棟 徳丸けやき苑 前野けやき苑 高島平けやき苑			52	継続	更新 2棟 常盤台けやき苑 中台けやき苑	31	更新 2棟 成増けやき苑 桜川けやき苑	49	22年度の更新予定 であった桜川けや き苑は、23年度へ 繰延べる
				順 調				更新中 2棟 常盤台けやき苑 中台けやき苑	24	更新 1棟 成増けやき苑	* 17		
034	二次避難所の充実 〔危機管理室 防災課〕	整備 10施設	48	整備 2施設			8	拡大	整備 4施設	20	整備 4施設	20	22年度整備予定分 については、23年 度へ繰延べる
				順 調				調査・検討中 整備予定 2施設 遅延等	8	調査	* 0		
035	防災無線のデジタル 化とセンター機能充 実 〔危機管理室 防災課〕	防災無線のデジタル 化 防災センター再構 築検討	480	緊急地震速報シ ステム試験運用 計測震度計設置			25	拡大	防災無線のデジタル 化 防災センター再構 築検討	47	防災無線のデジタル 化 防災センター再構 築検討	408	22年度予定の防災 センター実施設計 については、076 「区役所本庁舎南 館の改築」にあわ せて繰延べる
				遅延等				地域防災無線設 計中 同報系無線操作 卓作成中	39	防災無線のデジタル 化 防災センター再構 築検討	* 220		
036	自転車駐車場の整 備 〔土木部 交通安全課〕	整備 5か所	401	増設 1か所 準備 1か所			215	継続	新設 1か所 整備等 1か所 用地買収	142	新設 2か所	44	継 続
				遅延等				新設 1か所 整備等 1か所 用地買収	142	新設 3か所 改修 1か所	90		

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	
037	雨水の流出抑制 〔都市整備部 都市計画課〕	(新河岸川流域 約20.9km ²) 公共施設 60m ³ 透水性舗装 53m ³	30	(新河岸川流域) 学校 946m ³ 公園 10m ³ その他 206m ³	10	拡大	(新河岸川流域) 学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³ 公道 15m ³ 私道 1m ³	10	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	10	継続
(石神井川流域 約9.6km ²) 公共施設 60m ³ 透水性舗装 50m ³	公道 85m ³ 私道 1m ³	(石神井川流域) 学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³ 公道 10m ³ 私道 5m ³		学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³ 公道 10m ³ 私道 5m ³							
	(石神井川流域) 学校 473m ³ 公園 0m ³ その他 66m ³	(新河岸川流域) 学校 0m ³ 公園 0m ³ その他 71m ³ 公道 11m ³ 私道 0m ³		学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³ 公道 15m ³ 私道 1m ³							
		公道 3m ³ 私道 2m ³	前倒し			(石神井川流域) 学校 0m ³ 公園 0m ³ その他 54m ³ 公道 0m ³ 私道 0m ³	10	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³ 公道 10m ³ 私道 5m ³	8		
038	公園・公衆トイレの改修 〔土木部 みどり公園課〕	整備 12か所	98	整備 4か所	30	継続	整備 4か所	40	整備 4か所	28	22年度整備予定分 については、23年 度へ繰延べる
			順調	準備中 4か所			40	* 0			
			順調	順調							
039	公園大型遊具の改修 〔土木部 みどり公園課〕	改修 22公園	121	改修 6公園	28	継続	改修 8公園	46	改修 8公園	47	継続
			順調	設計中 8公園			89	* 0			
			順調	順調							
040	細街路の拡幅・指導 〔都市整備部 市街地整備課〕	拡幅 540件	558	拡幅 153件	172	改善	拡幅 180件	193	拡幅 180件	193	継続
			遅延等	拡幅 64件			173	* 173			
				順調							
041	区道の補修 〔土木部 計画課〕	整備 274,000m ²	4,066	整備 99,609m ²	1,265	継続	整備 90,000m ²	1,386	整備 92,000m ²	1,415	継続
			前倒し	89,238m ² 工事発注済			1,386	* 1,115			
				順調							
042	橋りょうの架替・改良 (1)架替・改良 〔土木部 計画課〕	架替 1橋 (新河岸橋) 北区との協定分担 金	121	架替 1橋 (新河岸橋) 北区との協定分担 金	121						22年度に予定して いた塗装8橋(区施 工7橋、協定による 鉄道会社施工1橋) のうち3橋について は、23年度へ繰延 べる
			達成								
	(2)調査・塗装 〔土木部 計画課〕	調査 39橋 塗装 23橋 長寿命化計画策 定	206	調査 39橋 塗装 7橋	48	継続	塗装 9橋 長寿命化計画策 定	105	塗装 7橋	53	
			前倒し	塗装工事設計 7 橋 長寿命化計画策 定中			105	* 72			
				遅延等							
043	自転車道の整備 〔土木部 計画課〕	整備 605m	97	整備 150m	23	継続	整備 185m	30	整備 270m	44	22年度から予定し ていた次期路線に ついては、一方通 行で道路幅員が狭 いため整備手法を 検討し、23年度に 設計予定
			順調	整備中 185m			25	4			
				順調							

事業番号	事業名 (担当部課)	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
044	視覚障がい者誘導 標の設置 〔土木部 計画課〕	設置 30か所	4	設置 44か所 達成	4						
045	歩道の段差解消 〔土木部 計画課〕	段差解消 150か 所	72	段差解消 50か所 順調	24	継続	段差解消 50か所 24 工事中 50か所 順調	24	段差解消 50か所 24 段差解消 50か所 ➡	24	継続
046	公共施設のバリアフ リー化 〔教育委員会事務局 新しい学校づくり担当〕	学校施設 設計 6校 工事完了 7校	-	学校施設 設計 1校 工事 3校 契約変更による設 計完了 1校 遅延等	-	継続	学校施設 設計 2校 工事完了 2校 学校施設 設計中 4校 工事中 2校 契約解除による設 計完了 1校 遅延等	-	学校施設 設計 2校 工事完了 2校 学校施設 設計 5校 工事完了 1校 ↙	-	22年度に予定して いた工事完了2校 のうち1校について は、062「学校施設 の改修(1)大規模 改修」にあわせて 23年度へ繰延べる
経費は 062「学校施設の改修(1)大規模改修」に含む											

緑と環境力UP

事業番号	事業名 (担当部課)	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
047	小中学校「緑のカー テン」体験学習の充 実 〔教育委員会事務局 庶務課〕	新規 37校	30	新規 7校 前倒し	11	拡大	新規 6校 準備 24校 新規 6校 準備中 24校 順調	12	新規 24校 準備 4校 新規 24校 ↙	7 *2	22年度予定準備工 事については、23 年度へ繰延べる
048	雨水の浸透と利用 〔資源環境部 環境保全課〕	浸透ます 150基 貯留槽 30基	9	浸透ます 44基 貯留槽 11基 遅延等	3	改善	浸透ます 50基 貯留槽 10基 浸透ます 3基 貯留槽 19基 遅延等	3 3	浸透ます 50基 貯留槽 10基 浸透ます 17基 貯留槽 10基 ↙	3 2	継続
049	自然環境の調査 〔資源環境部 エコポリスセンター 土木部 みどり公園課〕	調査 2回	19	昆虫調査 順調	5		緑地・樹木調査 緑地・樹木調査中 順調	14 14			継続
050	公園の新設 〔土木部 みどり公園課〕	新設 4か所 増設 2か所 設計 2か所	308	新設 2か所 増設 2か所 設計 1か所 順調	221	継続	新設 1か所 新設調整中 1か 所 順調	8 8	新設 1か所 設計 1か所 新設 1か所 増設 1か所 用地買戻し 1か所 ↙	79 786	継続
051	公園の改修 〔土木部 みどり公園課〕	改修 5か所 設計 4か所 バリアフリー化 9か所	405	改修 2か所 設計 2か所 バリアフリー化 3か所 次年度バリアフ リー化分設計 3か 所 順調	142	継続	改修 2か所 設計 1か所 バリアフリー化 3か所 改修中 1か所 改修予定 1か所 設計中 1か所 バリアフリー化予 定 3か所 次年度バリアフ リー化分設計予定 3か所 順調	131 131	改修 1か所 設計 1か所 バリアフリー化 3か所 改修 1か所 ↙	132 *115	22年度予定のバ リアフリー化3か所 については、23年 度へ繰延べる

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	事業方向性
052	公園台帳の整備 〔土木部 みどり公園課〕	測量・図面作成 80か所	88	調査・検討	0	改善	測量・図面作成 40か所	44	測量・図面作成 40か所	44	22年度予定分につ いては、23年度へ 繰延べる
				順調			測量・図面作成中 80か所	88		*0	
053	都市景観計画の策 定 〔都市整備部 都市計画課〕	景観計画作成 景観行政団体登 録	14	基本計画作成 景観計画作成審 議会設置 景観計画作成調 査	7	継続	景観計画作成準 備	6	景観計画作成 景観行政団体登 録	1	22年度予定の景観 計画作成につい ては、23年度へ繰延 べる
				順調			景観計画作成審 議会開催 景観形成重点地 区地元懇談会開 催	7	景観計画作成準 備 景観行政団体移 行	11	
054	無電柱化の促進 〔土木部 計画課〕	(仲宿地区) 電線共同溝工事	144	電線共同溝設計	8	継続	移設調整	16	電線共同溝工事	120	継 続
				順調			移設調整中	16	電線共同溝工事	186	
055	公共施設における省 エネルギー機器の導 入 〔資源環境部 環境保全課〕	効果測定 (赤塚体育館) 検証	1	効果測定	1	改善	検証	0			施設の改築・改修 等にあわせて省エ ネルギー機器の導 入を推進する
				順調			検証	0			
056	CO2削減区民運動 の推進 〔資源環境部 エコボリスセンター〕	開催 2回	2	開催 2回	2						
057	新エネルギー・省エ ネルギーの普及・啓 発 〔資源環境部 環境保全課〕	設置補助 太陽光発電システ ム 118台 太陽熱温水器 15台 高効率給湯器 455台 ガス発電給湯器 30台	26	設置補助 太陽光発電システ ム 26台 太陽熱温水器 3台 高効率給湯器 146台 ガス発電給湯器 4台	6	拡大	設置補助 太陽光発電システ ム 70台 太陽熱温水器 5台 高効率給湯器 255台 ガス発電給湯器 10台	14	設置補助 太陽光発電システ ム 24台 太陽熱温水器 5台 高効率給湯器 100台 ガス発電給湯器 10台	6	継 続
				順調			設置補助 太陽光発電システ ム 47台 太陽熱温水器 0台 高効率給湯器 154台 ガス発電給湯器 8台 燃料電池システム 3台	14	設置補助 太陽光発電システ ム 70台 太陽熱温水器 5台 高効率給湯器 120台 ガス発電給湯器 5台 燃料電池システム 30台	14	
058	板橋エコアクションの 普及・啓発 〔資源環境部 環境保全課〕	事業所 300件	3	事業所 11件	1	改善	事業所 100件	1	事業所 100件	1	継 続
				遅延等			事業所 6件	1	事業所 100件	1	
059	低公害清掃車両の 導入 〔資源環境部 清掃リサイクル課〕	導入 4台	3	導入 2台	1	継続			導入 2台	2	
				順調					導入 1台	1	

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	
060	幹線道路沿道地区 計画の推進 〔都市整備部 都市計画課〕	環状8号線A・B地区 (2.4km) 協議・調整 環状7号線地区 (4.2km) 協議・調整 川越街道B地区 (2.4km) 協議・調整 中山道地区 (6.8km) 協議・調整	5	環状8号線A・B地区 (2.4km) 協議・調整 環状7号線地区 (4.2km) 協議・調整 川越街道B地区 (2.4km) 協議・調整	1	継続	環状8号線A・B地区 (2.4km) 協議・調整 環状7号線地区 (4.2km) 協議・調整 川越街道B地区 (2.4km) 協議・調整	1	協議・調整 協議・調整 協議・調整 中山道地区 (6.8km) 協議・調整	3	継続
				川越街道B地区 (2.4km) 協議・調整			順調	1	協議・調整 協議・調整 沿道地区計画調査 中山道地区 (6.8km) 協議・調整	12	
				遅延等							

都市再生力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	
061	学校の改築 〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	改築1校 (板橋第三中) 設計3校 (板橋第一小 中台中 赤塚第二中)	2,525	実施設計1校 (板橋第三中) 基本設計3校 (板橋第一小 中台中 赤塚第二中)	127	拡大	仮設校舎設置、解体1校 (板橋第三中) 基本・実施設計3校 (板橋第一小 中台中 赤塚第二中)	77	工事1校 (板橋第三中) 実施設計、仮設校舎設置、解体3校 (板橋第一小 中台中 赤塚第二中)	2,321	中台中については、22年度に補強工事を行い、25年度に仮設校舎設置、解体を行う。
							順調	61	工事1校 (板橋第三中) 実施設計1校 (中台中) 実施設計、仮設校舎設置、解体2校 (板橋第一小 赤塚第二中)	*1,740	
				前倒し							

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	
062	学校施設の改修 (1)大規模改修	基本設計 8校 実施設計 10校 工事 12校 工事完了 7校	12,492	基本設計 5校 (板橋第二中 向原中 志村坂下小 板橋第四小 高島第二中) 実施設計 1校 (上板橋第四小) 実施設計 契約変更 改築へ計画変更 1校 (赤塚第二中) 工事 2校 (徳丸小 志村第一中) 工事完了 3校 (加賀中 志村第三中 赤塚第一中)	4,823	改善	基本設計 3校 (志村第五小 下赤塚小 西台中) 実施設計 3校 (板橋第二 向原中 高島第二中) 工事 2校 (志村第二中 高島第二中) 工事完了 2校 (徳丸小 志村第一中)	3,863	実施設計 5校 (志村第五小 志村坂下小 板橋第四小 下赤塚小 西台中) 工事 8校 (志村第五小 志村坂下小 板橋第四小 上板橋第四小 下赤塚小 板橋第二中 西台中 向原中) 工事完了 2校 (志村第二 高島第二中)	3,806	22年度予定の志村第二中2年目工事については、23年度へ繰延べる 前野小の耐震補強工事、向原中の大規模改修工事については、一度改築へと変更となったが、再検討の結果、22年度に改めて耐震補強等について調査・検討するとともに、補強工事を行い、その調査・検討結果に基づき計画を進める 22年度に1年目工事の志村第五小・上板橋第四小・下赤塚小・西台中については、2年目工事を23年度から25年度へ繰延べる
		〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当		前倒し			遅延等		調査・検討 2校 (前野小 向原中) 実施設計 5校 (志村第五小 志村坂下小 板橋第四小) 実施設計 2校 (板橋第二中 高島第二中) 実施設計契約解除 耐震補強・一部改築へ計画変更 1校 (向原中) 工事中 4校 (徳丸小 志村第一中 志村第二中 高島第二中)		
	(2)校庭の改修	工事完了 3校	150	工事完了 1校	50	継続	工事完了 1校	50	工事完了 1校	50	継続
	〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	順調	順調	30			*0				
	(3)散水設備の改修	整備完了 3校	52	整備完了 1校	14	継続	整備完了 1校	24	整備完了 1校	14	継続
〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	順調	順調	23	*0							
(4)プールの改修	設計 3校 工事完了 4校	416	設計 1校 工事完了 2校	274	継続	設計 1校 工事完了 1校	92	設計 1校 工事完了 1校	50	継続	
〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	順調	順調	59			*96					
(5)給食室の改修	設計 9校 工事完了 5校	-	設計 1校 設計 契約変更 1校 工事完了 2校	-	継続	設計 2校 工事完了 2校	-	設計 5校 工事完了 1校	-	062「学校施設の改修(2)大規模改修」にあわせて実施する	
〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	経費は 062「学校施設の改修(1)大規模改修」を含む	順調	遅延等			-					

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
063	区営住宅の大規模 改修 〔都市整備部 住宅政策課〕	(高島平七丁目ア パート) 1棟 88戸 大規模改修	679	基本設計 実施設計 順 調	15	継続	大規模改修完了	664			継 続
							大規模改修中	654			
064	地域センターの整備 〔区民文化部 地域振興課〕	仲宿地域セン ターの改築 改築 1か所	1,159	仲宿地域セン ターの改築 仮移転・解体・工 事 清水地域セン ターの改築 仮移転・解体 下赤塚地域セン ターの改築 仮移転・解体 順 調 下赤塚地域センターの改築 経費は 065「赤塚支所の改築」に含む	522	継続	仲宿地域セン ターの改築 工事完了	637	工事完了	-	
		清水地域セン ターの改築 改築 1か所					清水地域セン ターの改築 工事完了				
		下赤塚地域セン ターの改築 改築 1か所					下赤塚地域セン ターの改築 工事				
							仲宿地域セン ターの改築 工事完了				
		清水地域セン ターの改築 工事中 (21年11月完了予定)	637								
		下赤塚地域セン ターの改築 工事中		工事完了							
		順 調		順 調	⇒						
065	赤塚支所の改築 〔区民文化部 赤塚支所〕	改築 1か所	2,792	設計、仮庁舎改 修、仮移転、解体 順 調	358	継続	解体、工事	883	工事完了 仮庁舎解体	1,551	22年度予定の仮庁 舎解体工事につい ては、23年度へ繰 延べる
							解体、工事中	714	工事完了	*1,506	
				順 調			遅延等		⇒		
066	区民集会所の改修 〔区民文化部 地域振興課〕	改修 33か所	157	改修 15か所 順 調	35	継続	改修 7か所	49	改修 11か所	73	継 続
							改修完了 3か所 改修中 4か所	49	改修10か所	* 33	
							順 調		⇒		

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
067	公共施設の耐震補強工事 (1)学校施設	設計 16校 工事完了 29校	2,968	設計 8校 (志村第六小 蓮根第二小 緑小 大山小 上板橋小 紅梅小 高島第六小 高島第三中)	418	改善	設計 7校 (志村小 蓮根小 向原小 高島第三小 板橋第五中 上板橋第一中 上板橋第三中) 工事完了 11校 (志村第六小 前野小 蓮根第二小 緑小 大山小 上板橋小 紅梅小 高島第一小 高島第二小 高島第五小 高島第三中)	916	工事完了 9校 (志村小 前野小 蓮根小 向原小 高島第三小 高島第六小 板橋第五中 上板橋第一中 上板橋第三中)	1,634	
	〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当			設計中止 契約変更 1校 (前野小) 工事完了 9校 (志村第三小 新河岸小 板橋第二小 弥生小 赤塚小 成増小 北野小 板橋第一中 高島第一中) 計画変更 大規模改修へ 1校 (高島第二中)			設計中 7校 (志村小 蓮根小 向原小 高島第三小 板橋第五中 上板橋第一中 上板橋第三中) 工事中 6校 (志村第六小 蓮根第二小 緑小 大山小 紅梅小 高島第三中) 工事完了 3校 (高島第一小 高島第二小 高島第五小) 計画変更 大規模改修へ 1校 (前野小) 計画変更 22年度工事へ 1校 (上板橋小)	284	工事完了 8校 (志村小 上板橋小 蓮根小 高島第三小 高島第六小 板橋第五中 上板橋第一中 上板橋第三中)	1,098	
	(2)その他施設	設計 9施設 工事完了 13施設	380	設計 5施設 (成増地域センター集会室・志村橋保育園・あさひが丘保育園・若木保育園・かないくぼ保育園) 工事完了 4施設 (赤塚健康福祉センター・南前野保育園・紅梅保育園・西台保育園)	101	休廃止 継続	設計 4施設 (高島平あやめ保育園・氷川児童館・南板橋児童館・なります児童館) 工事完了 5施設 (成増地域センター集会室・志村橋保育園・あさひが丘保育園・若木保育園・かないくぼ保育園)	73	工事完了 4施設 (高島平あやめ保育園・氷川児童館・南板橋児童館・なります児童館)	206	
	〔区民文化部 地域振興課 健康生きがい部 赤塚健康福祉センター 子ども家庭部 子ども政策課〕			診断・設計中 4施設 (高島平あやめ保育園・氷川児童館・南板橋児童館・なります児童館) 工事中 1施設 (志村橋保育園) 工事準備 4施設 (成増地域センター集会室・あさひが丘保育園・若木保育園・かないくぼ保育園)			47	工事完了 2施設 (高島平あやめ保育園・なります児童館)	110		
				遅延等			遅延等				
				順調			順調				

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	
068	都市防災不燃化の 促進 〔都市整備部 市街地整備課〕	建替助成 2地区 46棟 新規事業区域の 指定 1地区 協議 1地区	207	建替助成 1地区7 棟 新規事業区域協 議 1地区	28	拡大	建替助成 2地区 14棟 新規事業区域の 指定 1地区	61	建替助成 2地区 25棟 協議 1地区	118	継 続
				遅延等		建替助成 1地区1 棟 新規事業区域の 協議中 1地区	19	建替助成 2地区 14棟	52		
069	住宅地区改良事業 の推進 〔都市整備部 市街地整備課〕	改良住宅 2棟竣 工 公園整備 道路・上下水道整 備	555	改良住宅 2棟竣 工 公園整備 道路・上下水道整 備	555						
				達 成							
070	木造住宅密集地域 の整備促進 (1)木造密集住宅整 備事業 〔都市整備部 市街地整備課〕	整備促進 5地区	2,258	整備促進 5地区	684	改善	整備促進 5地区	661	整備促進 5地区	913	各地区の事業期間 終了にあわせて地 区計画等の策定を 進める
				遅延等		整備計画推進事 業委託 3地区 地区計画策定委 託 3地区 老朽建物買収、土 地買収 1地区 土地買戻 1地区 擁壁詳細設計中 1地区 擁壁整備中 1地 区 道路整備中 1地 区 公園整備 2地区	377	整備促進 5地区	461		
	(2)防災街区整備事 業 〔都市整備部 再開発課〕	防災施設建築物 等工事完了 事業組合解散認 可	1,878	防災施設建築物 等工事	58	継続	防災施設建築物 等工事	1,106	防災施設建築物 等工事完了 事業組合解散認 可	714	
				順 調		防災施設建築物 等工事	1,094	防災施設建築物 等工事完了 事業組合解散認 可	779		
071	市街地再開発事業 の推進 (1)上板橋駅南口駅 前地区 〔都市整備部 再開発課〕	組合設立・事業認 可 権利変換計画認 可 工事	5,159	再評価調査委託	5	改善	組合設立・事業認 可 権利変換計画認 可	395	工事	4,759	22年度に行う事業 計画の再検討結果 に基づき23年度以 降の事業を進める
				遅延等		組合設立同意取 得中	4	事業計画再検討	16		
	(2)大山駅周辺地区 〔都市整備部 再開発課〕			[072]市街地整備 計画の策定(2) 板橋・下板橋・大 山駅周辺地区へ 移行							
	(3)板橋駅西口地区 〔都市整備部 再開発課〕			[072]市街地整備 計画の策定(2) 板橋・下板橋・大 山駅周辺地区へ 移行							

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)	
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性	
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費		
				進捗評価		進捗評価		事業量増減				
072	市街地整備計画の 策定 (1)赤塚周辺地区 〔都市整備部 都市計画課〕	市街地整備計画 素案策定 地区計画素案策 定	21	地元まちづくり検 討委員会設置 まちづくり懇談会 開催 市街地整備方針 策定	7	継続	市街地整備計画 素案・地区計画素 案策定準備 地元意向調査	6	市街地整備計画 素案策定 地区計画素案策 定	8	継続	
				順調				遅延等	6	市街地整備計画 素案策定作業 地区計画素案策 定作業		5
072	(2)板橋・下板橋・大 山駅周辺地区 〔都市整備部 板橋地域まちづくり 推進担当〕	地区まちづくり計 画素案策定調査・検 討	73	まちづくり協議会 設置準備(大山駅 周辺地区) 豊島区・板橋区ま ちづくり連絡会開 催	8	改善	まちづくり協議会 及び部会運営 (1地区) まちづくり計画 策定調査	31	まちづくり協議会 及び部会運営 (1地区) まちづくり計画 策定調査・検討	34	継続	
				順調				遅延等	30	まちづくり協議会 及び部会運営 (1地区) まちづくり計画 策定調査・検討 まちづくり構想案 の作成(1地区)		42
073	公共交通網の整備 促進 (1)東武東上線立体 化促進 〔都市整備部 都市計画課〕	東上線立体化検 討	3	検討	1	改善	検討	1	検討	1	継続	
				順調				検討中	1	検討		1
073	(2)エイトライナー構 想の実現 〔都市整備部 都市計画課〕	関係6区による促 進協議会	3	促進協議会	1	継続	促進協議会	1	促進協議会	1	継続	
				順調				促進協議会開催	1	促進協議会		1
074	コミュニティバスの実 験運行 〔都市整備部 都市計画課〕	実験運行 検証	60	調査・検討	10	継続	実験運行	26	検証 実験運行	24	継続	
			順調				実験運行準備中	26	実験運行	*28		
075	区道の新設 (1)補助87号線 〔土木部 計画課〕	測量、設計、事業 認可	28	協議・調整	0	改善	測量、設計	9	事業認可、測量、 設計	19	継続	
				遅延等				協議・調整中	2	測量、予備設計		15
				遅延等				遅延等				
075	(2)補助173号線 〔土木部 計画課〕	用地取得 埋設工事等	277	測量、用地取得、 付帯工事 事業計画変更認 可	240	継続	測量 埋設工事	17	用地取得 埋設工事	20	継続	
				順調				協議中	0	測量 埋設工事		17
075	(3)補助249号線 〔都市整備部 都市計画課〕	調査・検討	0	調査・検討	0	改善	調査・検討	0	調査・検討	0	継続	
				順調				調査・検討中	0	関係機関協議・検 討 調査・設計 地元対応・協議		17
076	区役所本庁舎南館の 改築 〔政策経営部 庁舎管理・建設課〕	工事	1,106	基本構想策定 本庁舎北館耐震 診断調査	22	継続	設計 仮移転	243	解体・工事	841	改築及び耐震補強 について多角的な 検討を行い、庁舎 南館の課題解決に 向けた方針を決定 する	
			順調				基本設計中 仮移転計画策定	183	事業手法等検討 仮移転計画策定	*274		

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
077	赤塚土木事務所の 移転整備 〔土木部 工事課〕	移転整備	96	移転整備	96						
				達成							

3つのナンバーワンに共通して

区民くらし充実力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		20年度計画			21年度計画		22年度計画		基本計画後期 (23～27年度)
		21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業結果 進捗評価	修正後 経費	行政 評価	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	21年1月追録版 事業量	追録版 経費	事業方向性
		新規事業量	新規 経費				進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
078	電子区役所の推進 (1)総合データベ ースの構築 〔政策経営部 IT推進課〕	総合データベース の構築	88	総合データベ ースの構築	88	改善					
				達成							
	(2)福祉総合シス テムの再構築 〔政策経営部 IT推進課〕	福祉総合シス テムの再構築	233				福祉総合シス テムの再構築	35	福祉総合シス テムの再構築	198	24年1月第二次稼 働に向けたシス テム再構築を継続す る
						構築業者の選定 福祉総合シス テムの設計	35	福祉総合シス テムの 開発 23年1月第一次稼 働	198		
	(3)住基法改正によ るシステムの一部再 構築 〔政策経営部 IT推進課 区民文化部 戸籍住民課〕	住基法改正によ るシステムの一部再 構築	380					住基法改正によ るシステムの一部再 構築	380	24年7月施行予定 の住民基本台帳法 の一部改正に向け て基幹系シス テムの一部再構築を進 める	
								新規			
079	文書管理システムの 構築 〔総務部 総務課〕	調査・検討	0	調査・検討	0	改善	調査・検討	0	調査・検討	0	25年度の本格稼働 に向けてシス テムの構築を進める
				遅延等			検討本部設置 調査・検討中	0	調査・検討	0	
							順調		順調		

いたばし 1 実現プラン「計画編」追録版

板橋区政策経営部政策企画課

平成 22 年（2010 年）2 月発行

〒173-8501 東京都板橋区板橋 2-66-1

TEL 03-3579-2011

URL <http://www.city.itabashi.tokyo.jp/>

刊行物番号

21 - 164

再生紙を使用しています



未来・創造
ITABASHI 21
