

都市計画道路補助第249号線の進捗状況について

都市計画道路補助第249号線整備事業は、令和11年度の整備完了をめざし、現在、用地取得、関係機関等協議及び設計を鋭意進めている状況である。

用地取得については、未取得用地が2筆あり、ともに用地折衝が難航していることから、今後も任意買収を原則として折衝を継続しつつ、土地収用制度の適用も視野に入れ、令和8年度から必要な準備を進めていく。

1 事業概要

- 事業名：東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第249号線
都市計画決定：昭和41年7月30日（建設省告示第2428号）
事業認可決定：平成30年9月25日（東京都告示第1347号）
事業変更認可決定：令和7年3月12日（東京都告示第181号）※5か年延伸
事業施行期間：平成30年9月25日から令和12年3月31日まで
事業規模：延長約100m
計画幅員15m（車道9.0m、歩道両側6.0m）

2 案内図



3 用地取得状況

用地買収対象面積：1116.18㎡


取得済み面積：1064.07㎡（公社取得用地含む）

未取得面積：52.11㎡（2筆）

用地取得率：95.3%（令和8年2月現在）



平成30年（事業認可時）

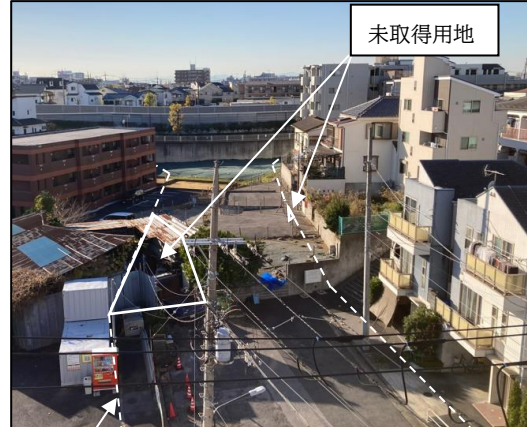

都市計画線

令和8年

4 今後のスケジュール

年度	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
用地取得									収用 申請準備	収用 申請・裁決		
工事												
