


これまでの建設地の様子 ～平成25年11月～



現在、南館地上1階床の躯体工事をを行っています。

(平成25年11月25日 撮影)

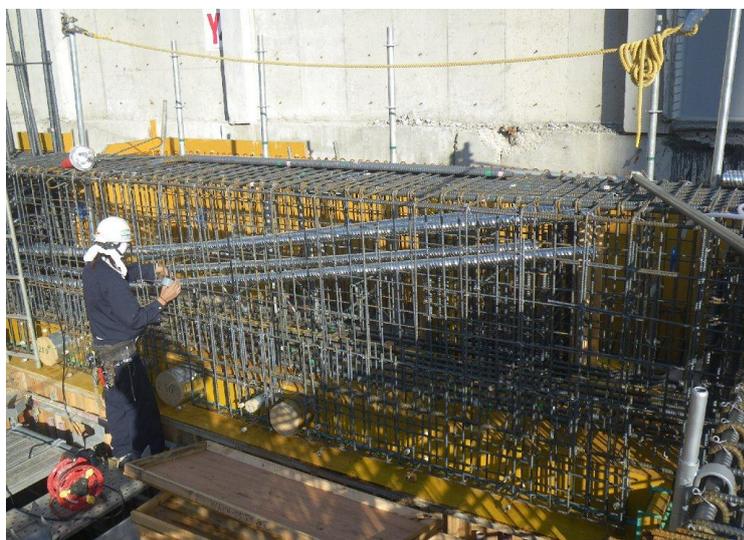

柱の間隔を広くするために、大梁の中にPC鋼線を埋め込んでいきます。そのため、管を設置しているところです。



山手通り側から工場現場内を撮影した状況です。

山手通り側から工区を分けて、コンクリートを順次打設していきます。
